ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....07....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	Construction of CC roads and other works at Shettyhalli colony balance roads in Ward No.12 Shettyhalli sub division [D12-20-000013]	99.00

23) ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್.ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆ / ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
2. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಿಸದೇ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
3. ಪ್ರಸುತ್ತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ (Road History) ಪ್ರಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
4. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ (Debris) ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನುಮೋದಿತ (Notified Dumping Yard)ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ Dumping Yardಗೆ ಇರುವ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Lead Chart ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
5. Non S.R ದರಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
6. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Defect Liability Period ಮುಗಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
7. ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ **MAS** ನ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ತರಹದ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ (ಮರು ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ) ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
8. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ:02/11/2017ರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆ./ಪಿ.ಆರ್/5054/2017-18 ರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

6/11/19

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

24) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

ಕಂಡಿಕೆ 23)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

S. Prabhu 16/11/2019

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

25) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

16/11/2019

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 08 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
26)	T/S. Technical Manager (west) KRIDL ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ.
27)	EE ಯವರಿಗೆ.

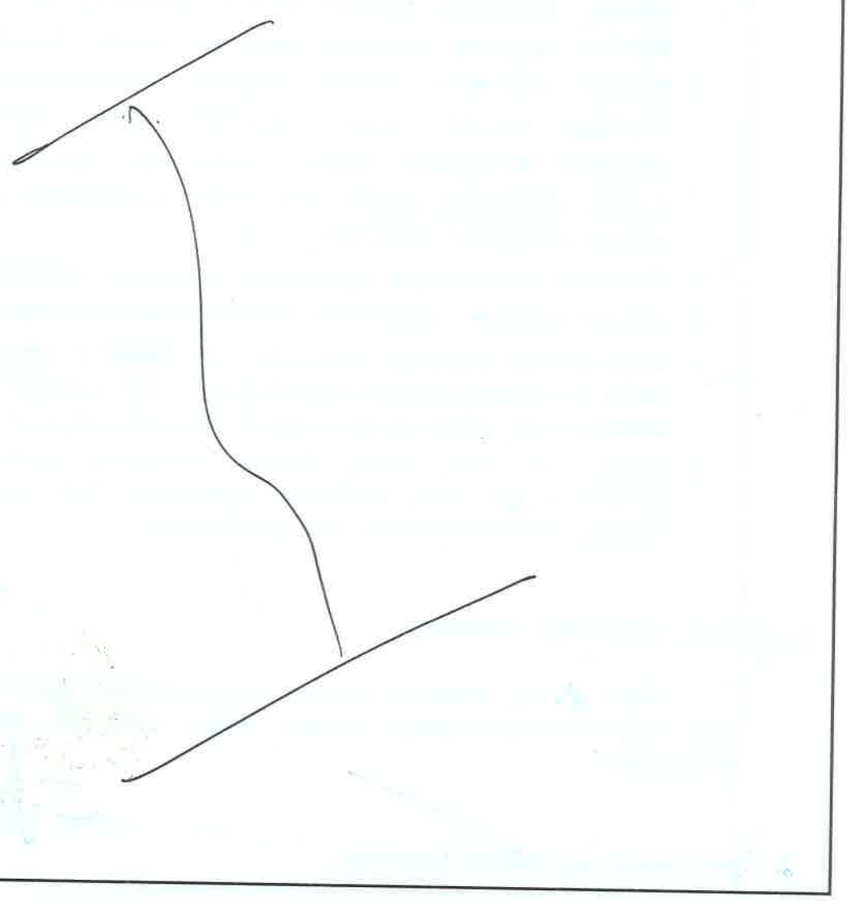

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

28)

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶ: ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :	Construction of CC roads and other works at Shettyhalli Colony balance roads in ward no.12 Shettyhalli Sub Division
2.	ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ :	012-20-000013
3.	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	Rs. 100.00 lakhs
4.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ :	Rs. 100.00 lakhs
5.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು :	ಮೆ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್
6.	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ:	19.11.2019 18.01.2020.
7.	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :	19.01.2020.
8.	ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ :	19.03.2020.
9.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :	
10.	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬದ ವಿವರ :	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ UGD & ಕೈಸ್ತ pipe line ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಾಕಿಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು 08/03/2021.
11.	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	
12.	ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ನಂ ಮತ್ತು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :	
13.	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರ :	ಶ್ರೀ. ಎ.ಪಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ.ಅ ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಾಗೇಶ್‌ಮೂರ್ತಿ ಸ.ಕಾ.ಅ
14.	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 9222695.47
15.	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರ್)	777304.53/-

29)

ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 18.01.20 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 17.03.2020 ರಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
31)	ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರು ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಯ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 08-03-2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 355 ದಿನಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
32)	A/s. pl. put & proceed
33)	ಕಂಡಿಕೆ (28) ರಿಂದ (31)ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯಂತೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:18.01.2020ರಂದು ಮೆ//ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:18.01.2020ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 17.03.2020ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08.03.2021ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 355ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
34)	ಮುಂದುವರೆದು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 318/2020-21, ದಿನಾಂಕ:03.02.2021ರಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯ ಕಾಲವಿಳಂಭ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ)ರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
35)	
36)	EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bengaluru Mahangara Palike, Dasarahalli Division, Bengaluru-57

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (33) ಮತ್ತು (34) ರಂತೆ ರೂ 10,000/- ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಧಿಸಿ (ಕಂಡಿಕೆ-19 ಟೀಪ್ಪಣಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಧಿಸಿ) EOT ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. (EE ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 18/7/2021 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

BRUHATH BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

FORMATE -01

EXTENSION OF THE TENDER PERIOD PROPOSAL FOR THE CONTRACT WORK WHICH DID NOT COMPLETED WITH IN DUR DATE

Sl No	Description	Details
1	Name of the Work	Construction of CC roads and other works at Shettyhalli Colony balance roads in ward no.12 Shettyhalli Sub Division
2	Estimated cost and Technical Sanction No and Date	Rs.99.00 Lakhs EE/DD/TS/58/19-20 Dt: 16.11.2019
3	Amount of Tender	9900000
4	Job Code No	012-20-000013
5	Name & Address of the contractor	M/s Technical Manager(West) KRIDL, #280, 59th cross, 17th C main road,, 3rd Y Block, Rajajinagara, Bangalore 560010
6	Agreement No & Date	EE/DD/AGR/503/19-20 Date: 18.01.2020
7	No & Date Under which the work order has been issued	EE/DD/WO/503/19-20 Date: 18.01.2020
8	Time limit Originally fixed for completion of time	60 Days
9	Date of application of contractor requesting for extension	18-01-2020
10	Date of receipt of application in Sub Division	18-01-2020
11	Weather time extended	———
12	Due date of Starting the work	28-01-2020
13	Due date of Completion of the work	08-03-2024
14	Actual Date of Completion of the work	08-03-2024
15	Progress achieved during first extension	88-1. Progress
16	Time extension period applied for	28-01-2020
17	No of Days	355 days
18	Time Extension Recommended	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
